

Бележки по отговора на МРР(Изх.№02-02-69/15.05.2014г.) на писмо на народните представители от 6-ти МИР , Тотю Младенов и Петя Аврамова заведено под вх.№02-02-69/16.04.2014г. ОТНОСНО „Реалното изпълнение на проектBG161PO001/4.1-04/2010/065-02

От отговора на писмото от МРР е видна следната хронология на фактите:

1. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на **14.06.2012г.** с обща стойност на допустимите разходи 917 458.48 лв., със срок на изпълнение 20 месеца и за краен срок 14.02.2014г.
2. На **14.02.2013г.** е постъпило искане от бенефициента за 305 054.95ЛВ. , което е изплатено.
3. На **01.07.2013г.** е постъпило искане от бенефициента за междинно плащане в размер на 295 731.08 лв. , което е изплатено в размер на 261 475.66лв. – **БЕЗ ПРОВЕРКА НА МЯСТО.**

ЗНАЧИ ДО ТУК СА ИЗПЛАТЕНИ 566 530.61лв.

4. На **21.10.2013г.** е подписан анекс към договора, засягащ намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по договора с повече от 15% , в резултат на проведени от бенефициента процедури за възлагане на обществени поръчки. (!?!? близо 4 месеца след като са изплатени 62 % от допустимите средства). Така новата сума на допустимите разходи става 868 086.08 лв. Така изплатената сума става **65%** от всички допустими разходи.

5. На **18.12.2013г.** е подписан анекс, относно промяна , изразяваща се в замяна на видове и количество СМР с нови видове и количество СМР, във връзка с настъпили непредвидени обстоятелство (!?) по време на строителството(каквото в същност не е имало) и разработено ново конструктивно решение за подпорната стена - предвидената бетонова конструкция е заменена с габиони (пълно с камъни и пръст телени мрежи).


По нататък в писмото е казано, че преди подписването на този анекс от 18.12. 2013г. бенефициента е представил документи, относно спирането на СМР на обекта с акт обр.10 от 05.04.2013г., поради високите води на р. Огоста в следствие на падналите проливни дъждове. (Цялото село знае , че до м 06.2013г НЕ СА ИЗВЪРШВАНИ НИКАКВИ СМР, за да бъдат спрени.) и акт Обр.10 от 28.06.2013г. поради необходимостта от ново техническо решение относно промяна в хидрологията на р. Огоста в следствие на изградената и въведена в експлоатация през октомври 2011г МВЕЦ „Елена“. **ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ - КОГАТО Е ПОДПИСВАН ДОГОВОРА И КОГАТО Е ИМАЛО КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ МВЕЦ „Елена“ е съществувал и следователно НИКАКВА ПРОМЯНА НА ХИДРОЛОГИЯТА НЕ Е ИМАЛО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО** на СМР, за които се твърди, че са извършени. **Обърнете внимание – Изпълнени са 62% (според бенефициента и контролиращия орган) от СМР, които са изплатени на 01.07.2013г.** по проекта преди промените в анекса от **18.12.2013г. т.е. за изграждане с бетонова конструкция – Очевидно е, че не е имало никакви СМР освен помощните (канал и прегради на р.Огоста)**

6. На **13.02.2014г.** Бенефициентът прави заключителна пресконференция, на която ОБЯВЯВА, ЧЕ ПРОЕКТА Е ЗЪВЪРШЕН и на 14.02.2014г. бенефициентът е депозирал искане за окончателно разплащане на стойност 254 425.45лв. – С КОЕТО ПОТВЪРЖДАВА ЗА ЗАВЪРШЕНИ СМР.

7. На **11.03.2014г.** е осъществена **проверка на място**, на която са установени **НЕДОВЪРШЕНИ СМР , възлизащи на около 10%** от общата стойност на договора.

НА САТЕЛИТНАТА СНИМКАТА НА **GOOGLE EARTH**, която по една случайност е правена на **18.03.2014г** (вижда се от информацията на Google) се вижда, че са изградени само около 65 метра (от 465 м по договор или **САМО 14%**) от предпазната стена . Като временния канал и временните преградни стени на р.Огоста са си там **ИНЕ СА ПРЕМАХНАТИ, КАКТО Е ПО ДОГОВОРА ЗА СМР.** В момента, 10.06.2014г. има изградени около 170м от Предпазна стена (от 465 м по договор) – **ВСИЧКО ТОВА Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОТАЛНА ФАЛШИФИКАЦИЯ, ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С**

НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗМАМА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО от страна на бенифициентът, изпълнителят и КОНТРОЛИРАЩИЯТ ОРГАН.

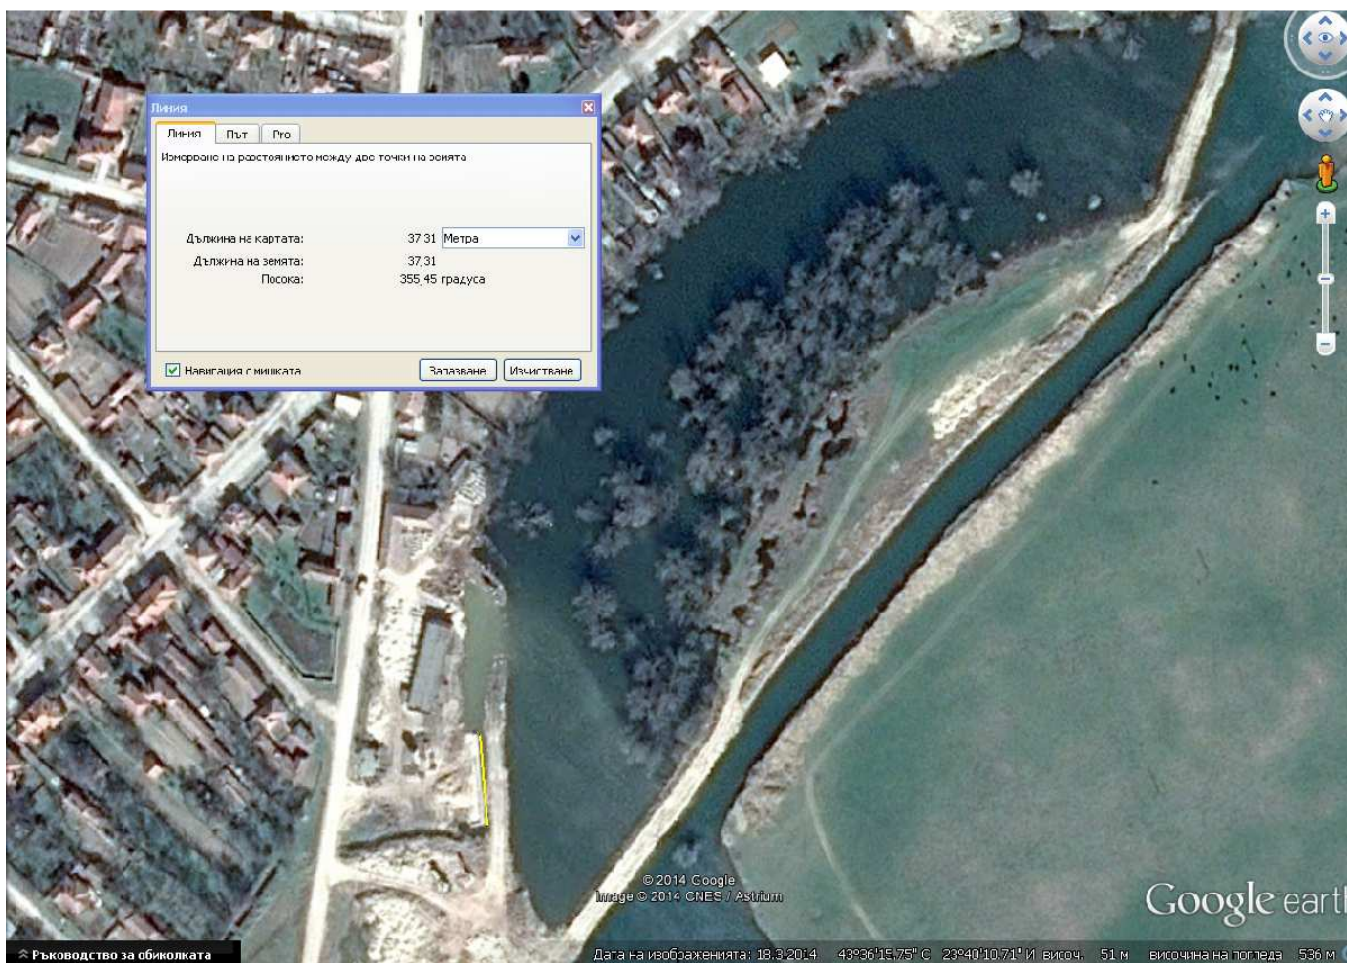

До жълтата линия е изградената стена към 18.03.2014г. Етикета показва действителната дължина на жълтата линия. Предпазната стена по договор трябва да е от началото на жълтата линия (горен край) до временната преградна стена вляво.
